

DAL BLUEPRINT APPROVATO ALLA BETA CONTROLLATA

Costruire TUPENSACI AI, con il giusto ordine.

Tempi, investimento e gate decisionali per trasformare il mockup in un prodotto reale, senza impegnare tutto il capitale prima di avere evidenze tecniche e d'uso.

18–20

SETTIMANE

beta controllata

€110–155k

+ IVA

range MVP

€130k

BUDGET GUIDA

pianificazione

€4–9k

AL MESE

post-beta

Il prodotto è sviluppabile. La scelta è come finanziarlo.

Per realizzare il Blueprint nella sua sostanza — non solo una chat con una frase quotidiana — serve un MVP controllato con memoria consensuale, corpus editoriale, sicurezza, privacy, backoffice e misurazione.

RACCOMANDAZIONE

Investire per gate. Ogni fase produce qualcosa di verificabile e autorizza — oppure ferma — la successiva.

Che cosa stiamo stimando

01 Esperienza completa
I 21 stati del mockup, incluso il ponte con Diario, Crea e L'Arte.

02 AI con una voce propria
Corpus, retrieval, regole editoriali e test di qualità.

03 Memoria consensuale
Ricordi espliciti, controllabili e cancellabili.

04 Sicurezza e privacy
Consensi, crisi, minimizzazione, audit e revisione.


05 Controllo operativo
Backoffice, analytics e osservabilità.

06 Beta controllata
100–300 persone e decisione basata sui dati.

Accuratezza della stima: $\pm 20\%$ oggi; circa $\pm 10\%$ dopo le due settimane di progettazione tecnica.

Venti settimane, con attività in parallelo.

Avvio ipotizzato: 3 agosto 2026 · Beta controllata: 18 dicembre 2026

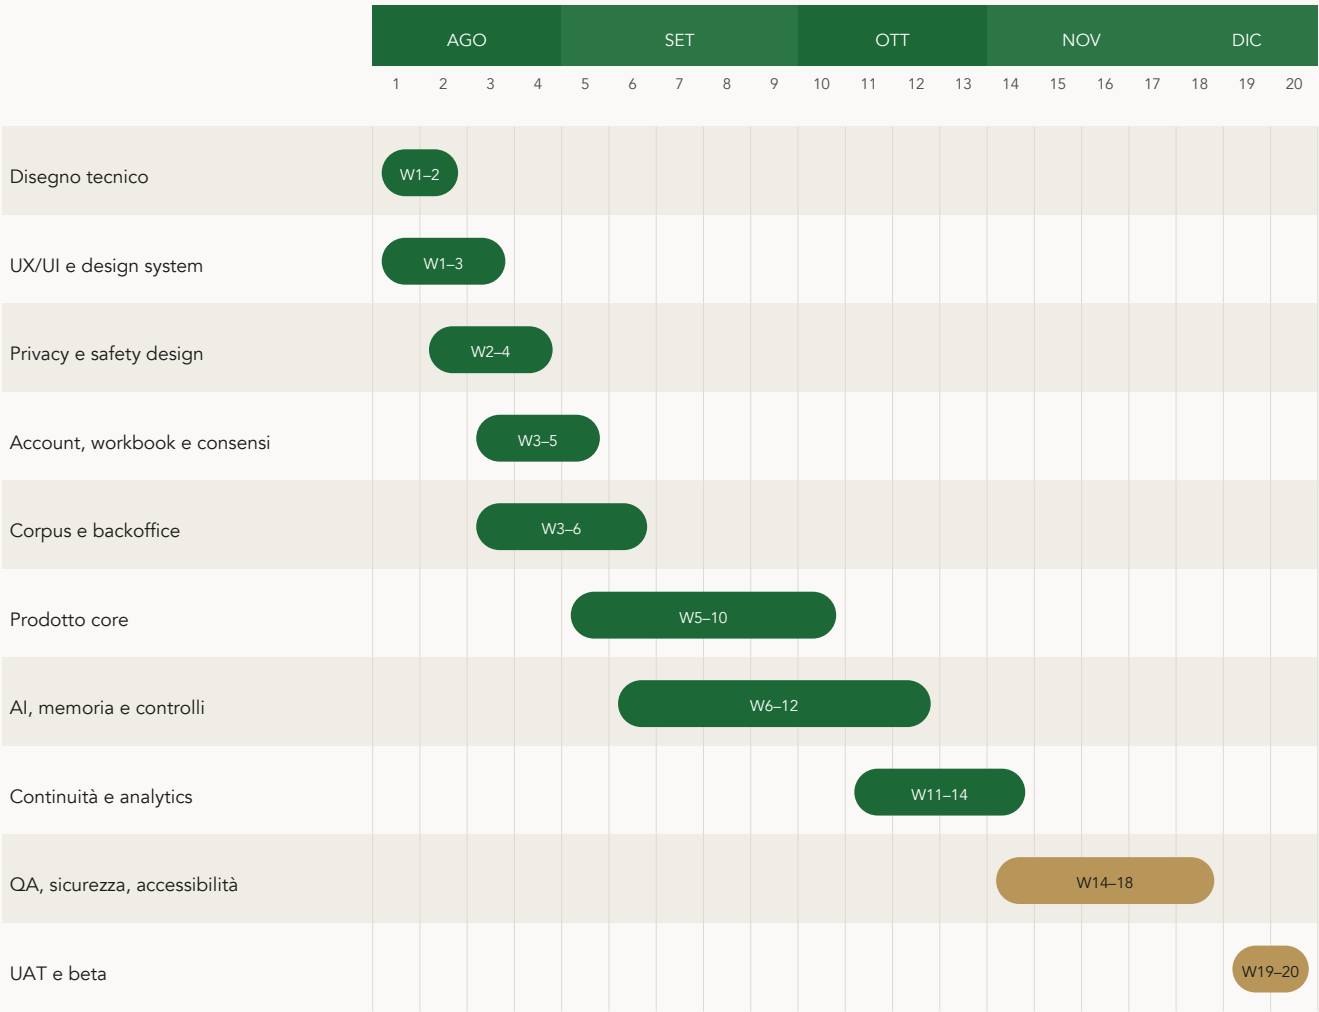

Il piano viene ricalibrato al Gate 1. Le durate presuppongono un team già formato e decisioni disponibili nei tempi concordati.

Il costo non è “l'AI”. È il sistema che la rende affidabile.

TOTALE STIMATO	€110–155k + IVA
----------------	-----------------

Disegno tecnico, architettura e flussi dati	€10–14k
UX/UI e design system	€7–10k
Account, database, consensi e ambienti	€13–18k
AI, corpus, memoria, safety e controlli	€24–32k
Web app completa sui 21 stati	€21–28k
Backoffice, analytics e audit	€7–10k
QA, sicurezza, accessibilità e beta	€12–17k
Validazione specialistica privacy e safety	€8–12k
Contingency	€8–12k

Le voci sono presentate per capacità, non come capitolato definitivo. La somma puntuale dei massimi è volutamente più alta del range complessivo perché alcune attività condividono risorse.

Scegliere quanto imparare, prima di scegliere quanto scalare.

01 · PILOTA TECNICO

Ridotto

6–8 settimane
€30–45k

Flusso principale, molte operazioni manuali, 30–50 tester. Verifica la fattibilità, non il mercato.

02 · RACCOMANDATO

MVP controllato

18–20 settimane
€110–155k

Blueprint nella sua sostanza, con memoria, corpus, safety, privacy e beta su 100–300 persone.

03 · VERSIONE MERCATO

V1 scalabile

26–32 settimane
€185–260k

Pagamenti, supporto, affidabilità e scala. Prematuro prima dei dati della beta.

Il criterio di scelta

Sotto €70k si eliminano quasi certamente memoria, safety, backoffice, valutazioni AI o hardening privacy. Sopra €170k, per un MVP, devono esserci capacità o garanzie ulteriori chiaramente esplicitate.

Quattro gate. Non un assegno unico.

Ogni tranche viene autorizzata solo se l'output precedente è completo, verificato e ancora coerente con l'obiettivo.

01 Progettazione tecnica €10–14k

Architettura, dati, safety, backlog, fornitori e stima ricalibrata.

02 Vertical slice funzionante €45–60k

Workbook Bridge / frase / conversazione / memoria: il cuore del prodotto end-to-end.

03 Completamento della beta €45–65k

Prodotto completo, backoffice, QA, sicurezza, privacy e rilascio controllato.

04 Decisione post-beta Dopo i dati

Nuovo investimento solo su uso, ritorno, qualità, sicurezza e disponibilità a pagare.

PRIMO IMPEGNO PROPOSTO

2 settimane · €10–14k · output: decisione go / revise / stop

Il cloud costa poco. La cura del prodotto no.

Stima mensile per una beta controllata con 100–300 utenti.

GESTIONE POST-BETA

€4–9k / mese

Infrastruttura, database, accessi, email

€100–300 / mese

Utilizzo modelli AI

€70–250 / mese

Monitoraggio, backup e strumenti

€80–200 / mese

Manutenzione, AI QA e supporto

€3–7k / mese

Supervisione privacy/safety opzionale

€500–1.500 / mese

Come leggere i €300.000 del pitch

Non servono tutti per
sviluppare l'MVP.

Possono avere senso come capitale per dodici mesi: sviluppo, team, contenuti, acquisizione, supporto e iterazioni. Come puro costo tecnico indeboliscono il pitch; come runway da prodotto a mercato lo rafforzano.

Esclusi: marketing, produzione editoriale continuativa e compensi dei founder.

Cosa include. E cosa no.

INCLUSO

- Web app responsive
- Workbook Bridge manuale e QR-ready
- 100–300 utenti beta
- Integrazione AI via API
- Corpus TUPENSACI iniziale
- Backoffice essenziale
- Privacy, safety, QA e beta

NON INCLUSO

- OCR o lettura della scrittura
- App native iOS/Android
- Marketing e acquisizione
- Team editoriale continuativo
- Assistenza 24/7
- Certificazioni cliniche
- Internazionalizzazione

PASSO SUCCESSIVO PROPOSTO

Autorizzare solo il Gate 1.

Due settimane per convertire Blueprint e mockup in architettura, backlog, specifiche dati, piano privacy/safety e richiesta d'offerta confrontabile tra fornitori.

Una stima da validare, non un numero da difendere.

Metodo

La stima è costruita sul Product Blueprint v1.1 e sul mockup funzionale v1.1. Il Workbook Bridge resta manuale e QR-ready; l'OCR è escluso. Il range deve essere confermato nel Gate 1 tecnico e non sostituisce la proposta economica di un team selezionato né una revisione legale.

Riferimenti per i costi operativi

OpenAI · API pricing

<https://openai.com/api/pricing/>

Supabase · Pricing

<https://supabase.com/pricing>

Cloudflare Workers · Pricing

<https://developers.cloudflare.com/workers/platform/pricing/>

Resend · Pricing

<https://resend.com/docs/knowledge-base/what-is-resend-pricing>

Principio guida

La prima decisione non è se spendere €130.000. È se spendere €10–14.000 per sapere con precisione che cosa costruire, con chi e a quali condizioni.
