

DAL BLUEPRINT APPROVATO AL LANCIO PAGANTE

Costruire TUPENSACI AI, con il giusto ordine.

Tempi, investimento e gate decisionali per trasformare il mockup in un prodotto reale: beta M4–M6 e readiness commerciale per il lancio pagante da M7.

18–20

SETTIMANE

beta + launch ready

€110–155k

+ IVA

range MVP

€130k

BUDGET GUIDA

pianificazione

€4–9k

AL MESE

post-beta

Il prodotto è sviluppabile. La scelta è come finanziarlo.

Per realizzare il Blueprint nella sua sostanza — non solo una chat con una frase quotidiana — serve un MVP con memoria consensuale, corpus, sicurezza, privacy, billing, backoffice e misurazione, pronto a passare dalla beta al mercato.

RACCOMANDAZIONE

Investire per gate. Ogni fase produce qualcosa di verificabile e autorizza — oppure ferma — la successiva.

Che cosa stiamo stimando

01 Esperienza completa
I 21 stati del mockup: ingresso AI autonomo e ponte facoltativo con Diario, Crea e L'Arte.

02 AI con una voce propria
Corpus, retrieval, regole editoriali e test di qualità.

03 Memoria consensuale
Ricordi espliciti, controllabili e cancellabili.

04 Sicurezza e privacy
Consensi, crisi, minimizzazione, audit e revisione.


05 Controllo operativo
Backoffice, analytics e osservabilità.

06 Beta e lancio
100–300 persone in beta; abbonamenti e lancio pagante da M7.

Accuratezza della stima: $\pm 20\%$ oggi; circa $\pm 10\%$ dopo le due settimane di progettazione tecnica.

Venti settimane, con attività in parallelo.

Avvio ipotizzato: 3 agosto 2026 · Beta controllata: 18 dicembre 2026

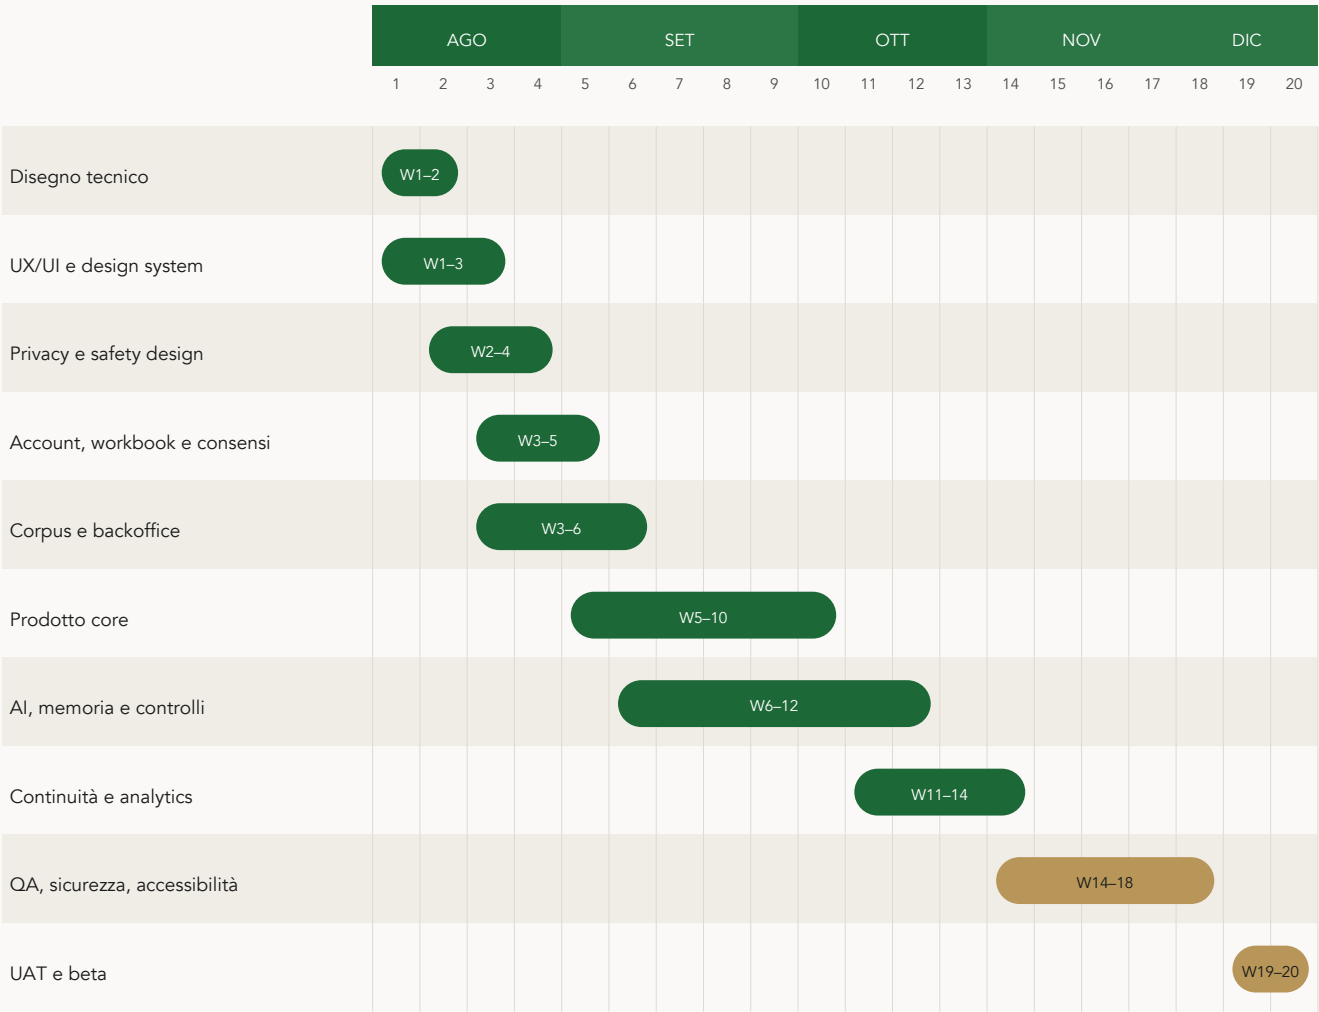

Il piano viene ricalibrato al Gate 1. Le durate presuppongono un team già formato e decisioni disponibili nei tempi concordati.

Il costo non è “l'AI”. È il sistema che la rende affidabile.

TOTALE STIMATO

€110–155k

+ IVA

Disegno tecnico, architettura e flussi dati	€10–14k
UX/UI e design system	€7–10k
Account, database, consensi e ambienti	€13–18k
AI, corpus, memoria, safety e controlli	€24–32k
Web app completa sui 21 stati	€21–28k
Backoffice, analytics e audit	€7–10k
QA, sicurezza, accessibilità e beta	€12–17k
Validazione specialistica privacy e safety	€8–12k
Contingency	€8–12k

Le voci sono presentate per capacità, non come capitolato definitivo. La somma puntuale dei massimi è volutamente più alta del range complessivo perché alcune attività condividono risorse.

Scegliere quanto imparare, prima di scegliere quanto scalare.

01 · PILOTA TECNICO

Ridotto

6–8 settimane
€30–45k

Flusso principale, molte operazioni manuali, 30–50 tester. Verifica la fattibilità, non il mercato.

02 · RACCOMANDATO

MVP launch-ready

18–20 settimane
€110–155k

Blueprint completo, beta 100–300, billing italiano, entitlement e capacità per il lancio pagante.

03 · ESPANSIONE

V1 estesa

26–32 settimane
€185–260k

App native, multilingua, enterprise e scala oltre 10.000 attivi. Solo dopo i dati del lancio.

Il criterio di scelta

Sotto €70k si eliminano quasi certamente memoria, safety, backoffice, valutazioni AI o hardening privacy. Sopra €170k, per un MVP, devono esserci capacità o garanzie ulteriori chiaramente esplicitate.

Un round da €300.000. Quattro fasi verificabili.

Agli investitori viene richiesto l'intero round. Le fasi sotto sono checkpoint tecnici per governare l'impiego del capitale, non raccolte separate.

01	Progettazione tecnica	€10–14k
Architettura, dati, safety, backlog, fornitori e stima ricalibrata.		
02	Vertical slice funzionante	€45–60k
Ingresso AI autonomo / frase / conversazione / memoria + Bridge facoltativo: il cuore end-to-end.		
03	Beta e launch readiness	€45–65k
Prodotto, billing, backoffice, QA, sicurezza, privacy, capacity e rilascio controllato.		
04	Go / no-go lancio	Dopo i dati
Paid launch da M7 solo se uso, ritorno, qualità, sicurezza e disponibilità a pagare superano i gate.		

PRIMO WORK PACKAGE TECNICO

2 settimane · €10–14k · output: decisione go / revise / stop

Il cloud costa poco. La cura del prodotto no.

Costi operativi iniziali; il Business Plan v2.1 modella separatamente la crescita fino a circa 2.000 attivi a M12.

GESTIONE POST-BETA

€4–9k / mese

Infrastruttura, database, accessi, email

€100–300 / mese

Utilizzo modelli AI

€70–250 / mese

Monitoraggio, backup e strumenti

€80–200 / mese

Manutenzione, AI QA e supporto

€3–7k / mese

Supervisione privacy/safety opzionale

€500–1.500 / mese

Come leggere i €300.000 del pitch

Non servono tutti per
sviluppare l'MVP.

Sono un unico round per dodici mesi: sviluppo, team, contenuti, acquisizione, supporto e iterazioni. Il piano punta a circa 2.000 utenti AI attivi a M12 e 4.000 a M24; i checkpoint governano l'allocazione e l'accelerazione, non la raccolta.

La build non include media: il Business Plan prevede €4k/mese M7–M18 e €6k/mese da M19. Team, agenzia e produzione editoriale sono linee separate.

Cosa include. E cosa no.

INCLUSO

- Web app responsive
- Ingresso AI autonomo
- Workbook Bridge facoltativo e QR-ready
- Beta 100–300 + launch readiness
- Billing italiano ed entitlement
- Corpus e backoffice essenziale
- Privacy, safety, QA e capacity

NON INCLUSO

- OCR o lettura della scrittura
- App native iOS/Android
- Media e acquisizione
- Team editoriale continuativo
- Assistenza 24/7
- Certificazioni cliniche
- Internazionalizzazione

PASSO SUCCESSIVO PROPOSTO

Avviare lo sviluppo dal Gate 1.

Due settimane per convertire Blueprint e mockup in architettura, backlog, specifiche dati, piano privacy/safety e richiesta d'offerta confrontabile tra fornitori.

Una stima da validare, non un numero da difendere.

Metodo

La stima è costruita sul Product Blueprint v1.3, sul MVP Development Brief v1.3, sul mockup funzionale v1.3 e sul Business Plan v2.1. L'AI funziona autonomamente; il Workbook Bridge resta facoltativo; billing italiano e launch readiness sono inclusi; OCR, media e internazionalizzazione sono esclusi. Il range va confermato nel Gate 1 tecnico.

Riferimenti per i costi operativi

OpenAI · API pricing

<https://openai.com/api/pricing/>

Supabase · Pricing

<https://supabase.com/pricing>

Cloudflare Workers · Pricing

<https://developers.cloudflare.com/workers/platform/pricing/>

Resend · Pricing

<https://resend.com/docs/knowledge-base/what-is-resend-pricing>

Principio guida

Il round richiesto resta €300.000. Il primo affidamento tecnico è di €10–14.000 per sapere con precisione che cosa costruire, con chi e a quali condizioni.
